

Information Hafenbetriebe zu Sperrungen 26.3. – 30.4.2018

Saarbrückener Straße, Anschlussstelle Königshof, Marthweg, Linzer
Straße

1. Grundsätzliches zum Projekt Erneuerung der Hafentrassen
2. Bündelung von Maßnahmen im Bereich Saarbrückener Straße, Marthweg, Wiener Straße, Linzer Straße
3. Information zu den Provisorien zum Ersatzneubau der Hafentrassen

1. Grundsätzliches zum Projekt Erneuerung der Hafentrassen
2. Bündelung von Maßnahmen im Bereich Saarbrückener Straße, Marthweg, Wiener Straße, Linzer Straße
3. Information zu den Provisorien zum Ersatzneubau der Hafentrassen

Servicebetrieb Öffentlicher Raum



Frankenschnellweg



Anlegestelle



Straßenbau



Grünflächen



Brückenbau



Beleuchtung

Projekt Hafenbrücken




Quelle Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung



Themen

1. Grundsätzliches zum Projekt Erneuerung der Hafentrassen
2. Bündelung von Maßnahmen im Bereich Saarbrückener Straße, Marthweg, Wiener Straße, Linzer Straße
3. Information zu den Provisorien zum Ersatzneubau der Hafentrassen

Bündelung von Maßnahmen

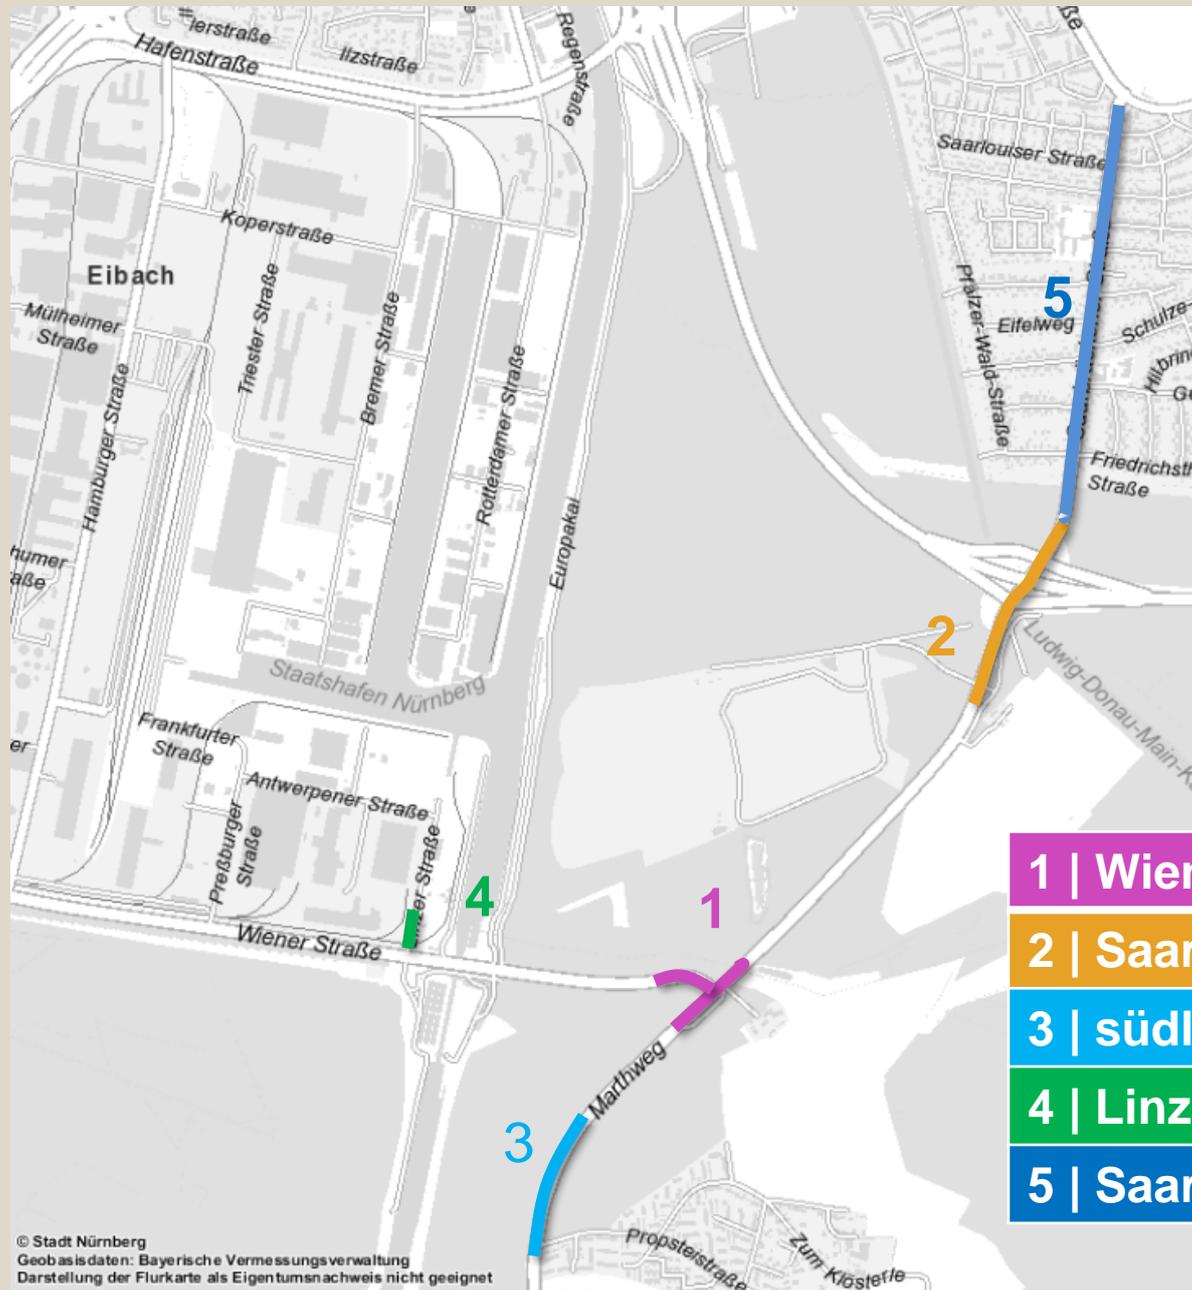


Osterferien
 Mo, 26.03.2018 –
 Sa, 07.04.2018

Schleusensperre
 Di, 10.04.2018 –
 Mo, 30.04.2018


- 1 | Wiener Straße / Marthweg
- 2 | Saarbrückener Straße / AS Königshof
- 3 | südlicher Marthweg bis Propsteistraße
- 4 | Linzer Straße
- 5 | Saarbrückener Straße

1. Ausbau Knoten Wiener Str. / Marthweg


Phase 3, 26.03.-30.04.2018

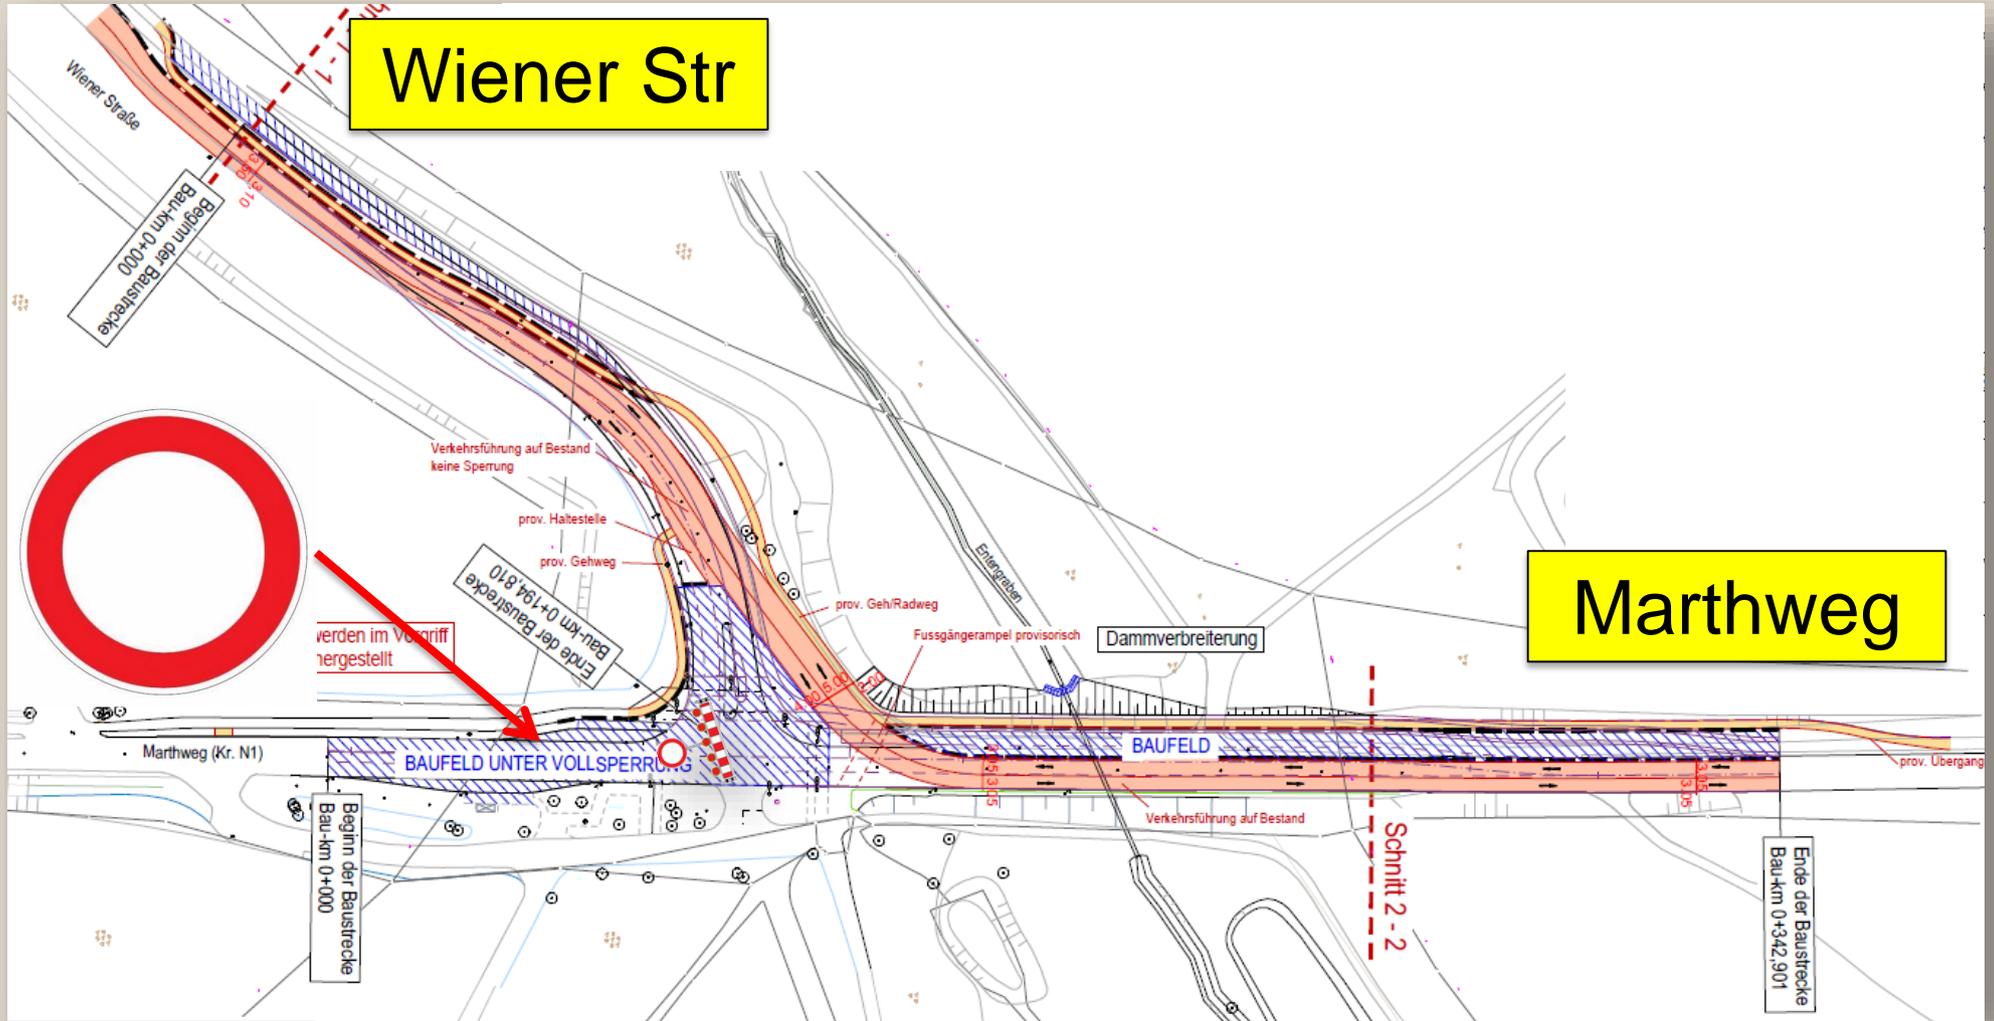

2. Ausbau Knoten Saarbrückener Straße/ BAB A 73 Anschlussstelle Königshof 26.3.-30.4.2018

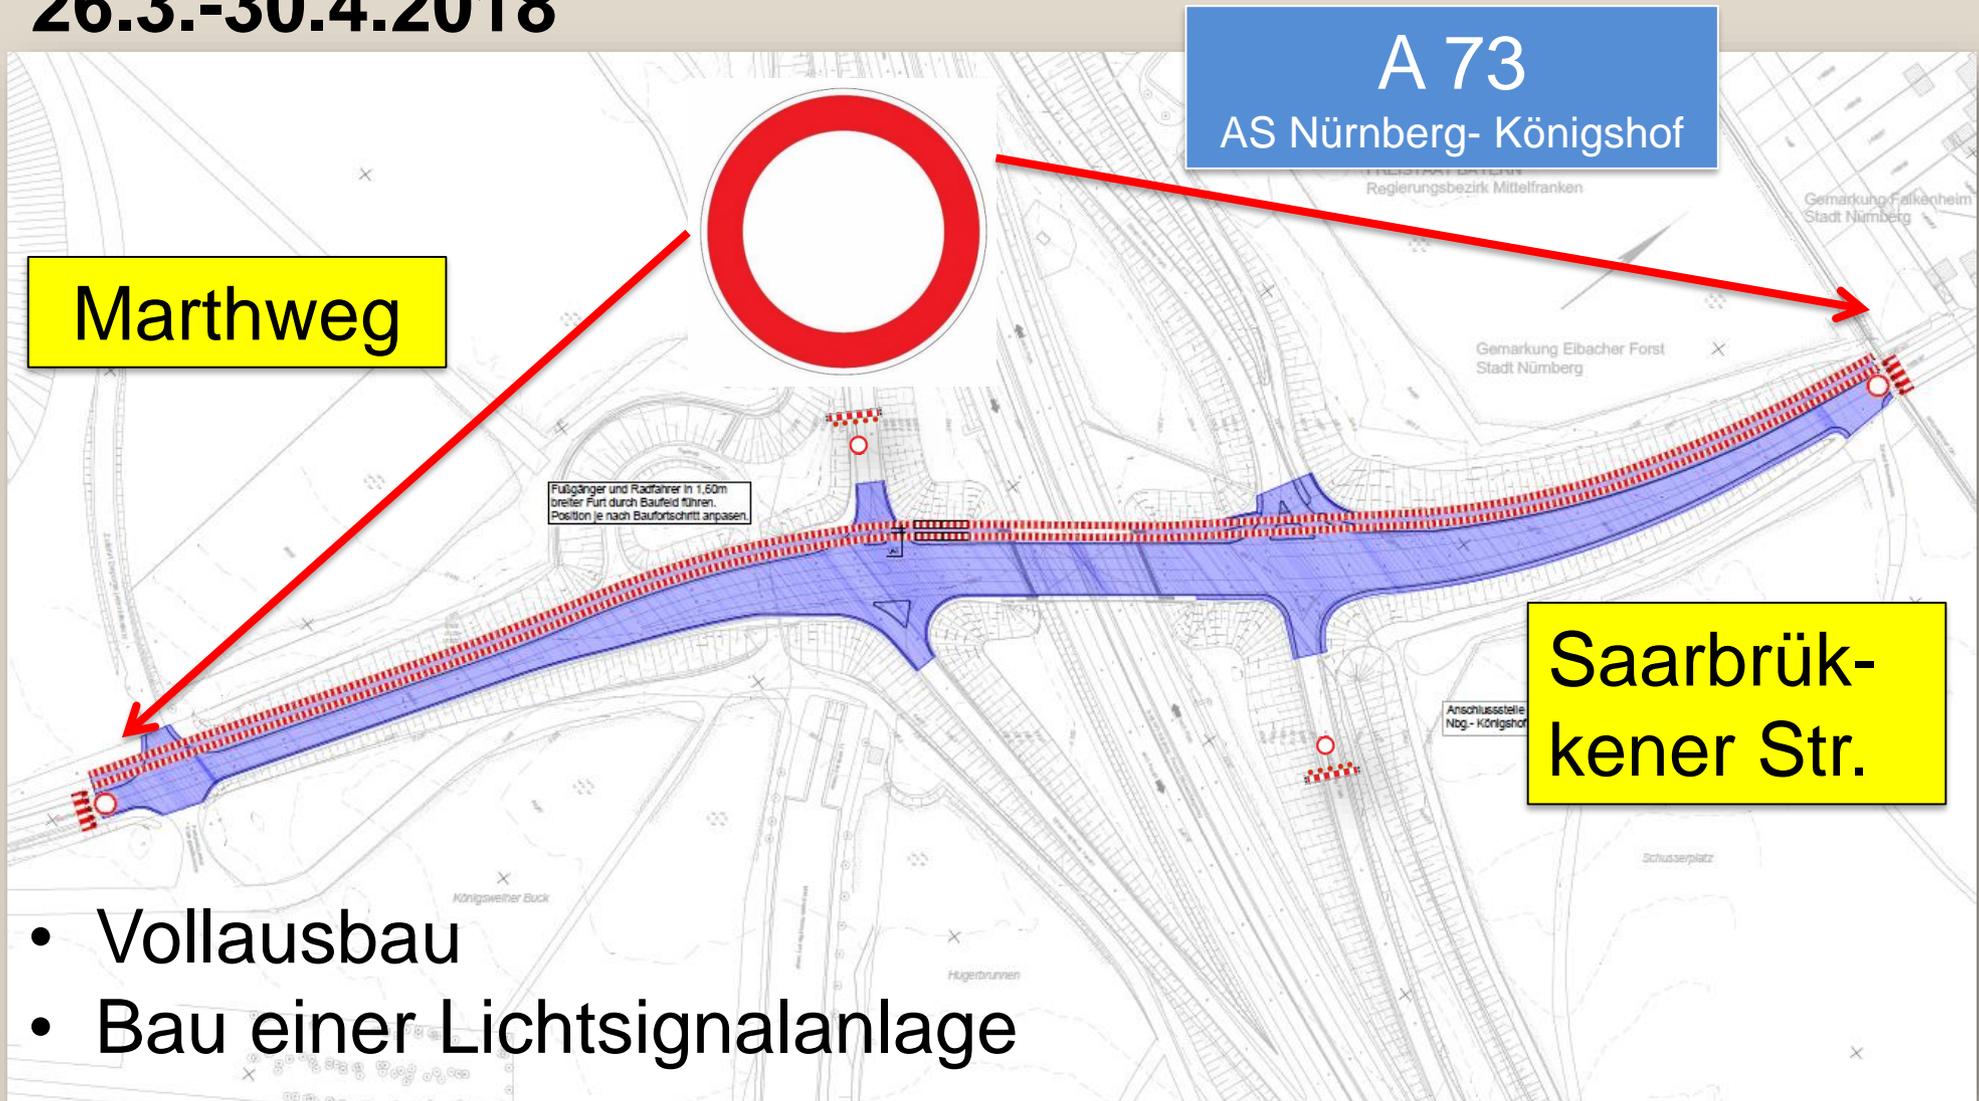

3. Sanierung Fahrbahn Marthweg Bereich Propsteistraße nördlich

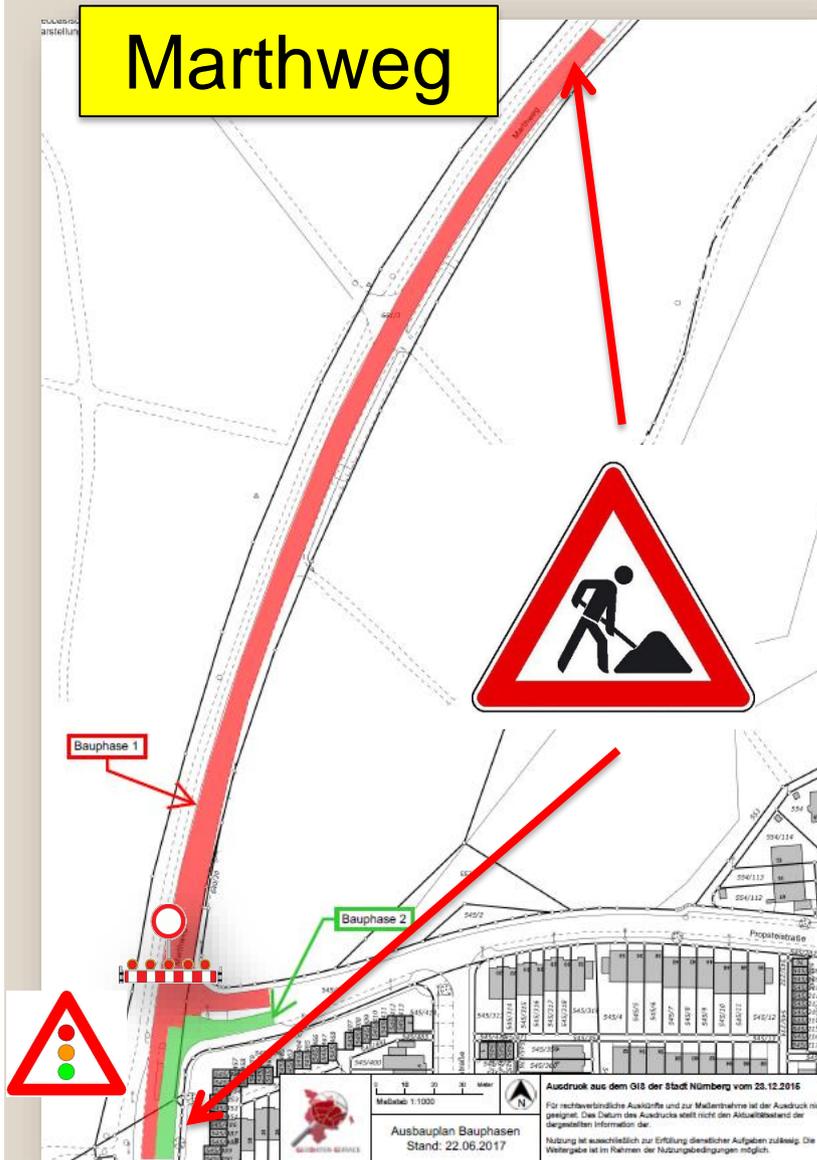


Dauer ca. 3 Wochen
(geplant 2.-22.4.18)



Zufahrt Propsteistraße über
Engstellensignalisierung

Propsteistr.

4. Sanierung Brücke Linzer Straße

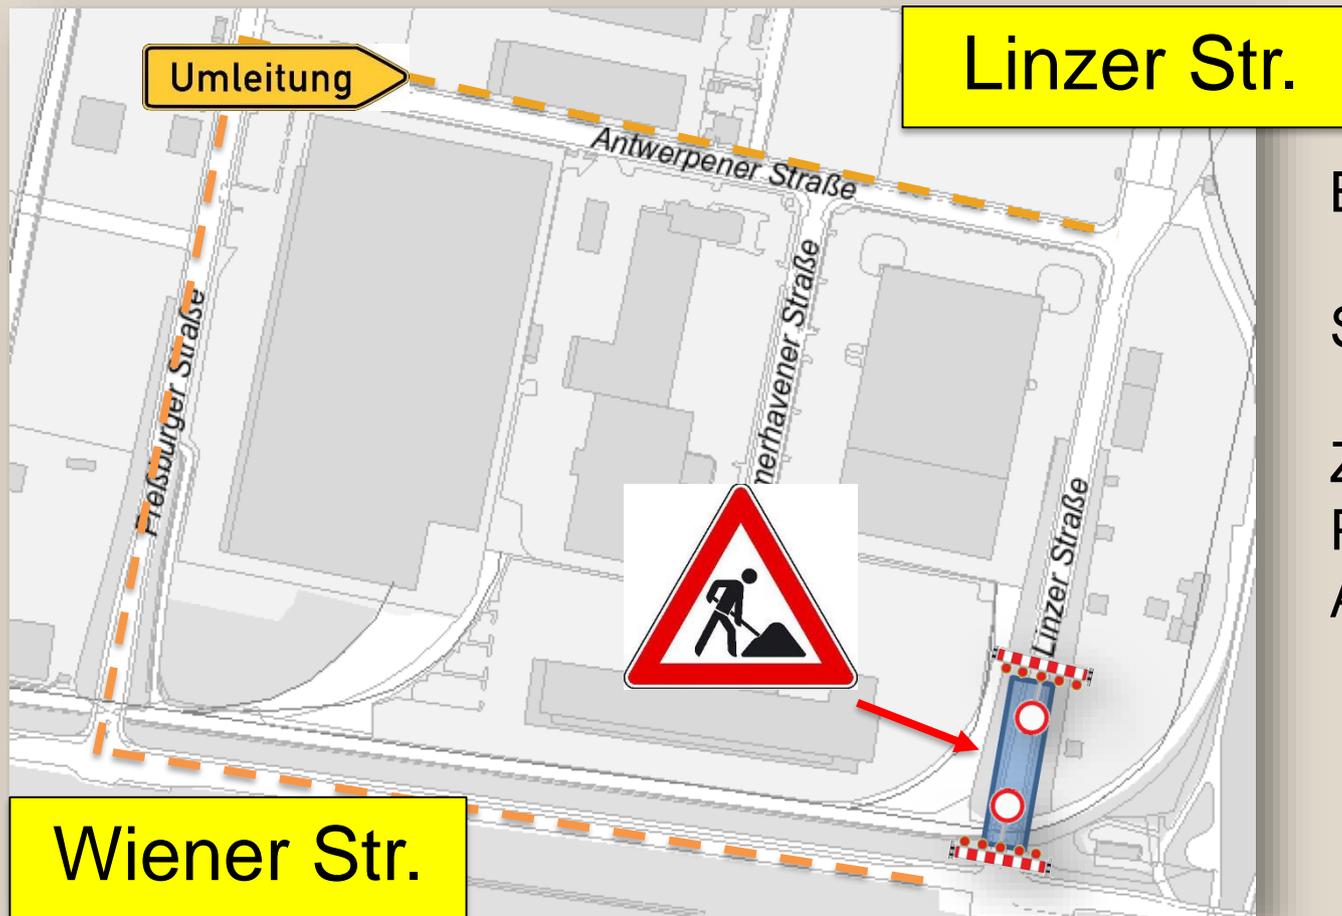


Bauzeit April – Juni 2018

Sperrung 7.4.-30.4.18

Zufahrt Linzer Str. über
Preßburger Str. /
Antwerpener Str. möglich

5. Deckensanierung Saarbrückener Straße

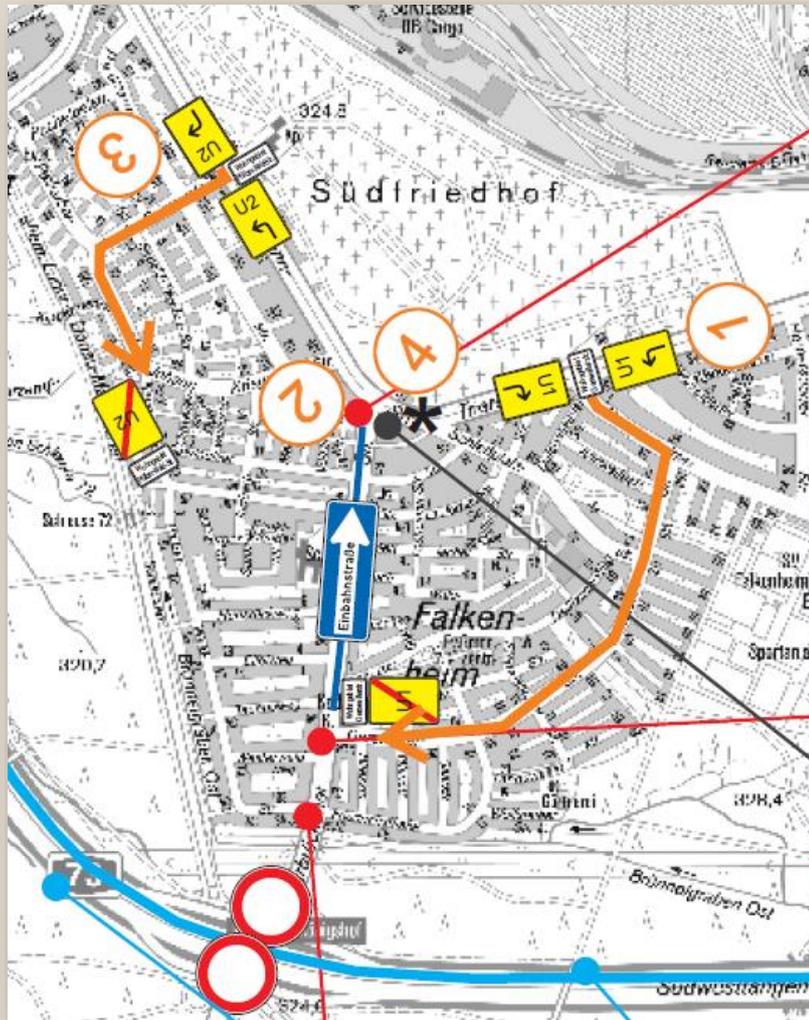


Fahrbahndecke wird erneuert
 Mo, 26.03.2018 – Sa, 07.04.2018
 (in den Osterferien)

U1 - Zufahrt Ost über
 Germersheimer Str. /
 Pirmasenser Str. /
 Gersweilerstraße

U2 - Zufahrt West über
 An der Schwarzlach

Geplante Umleitungsstrecken 26.03-30.04.2018 (PKW / LKW)

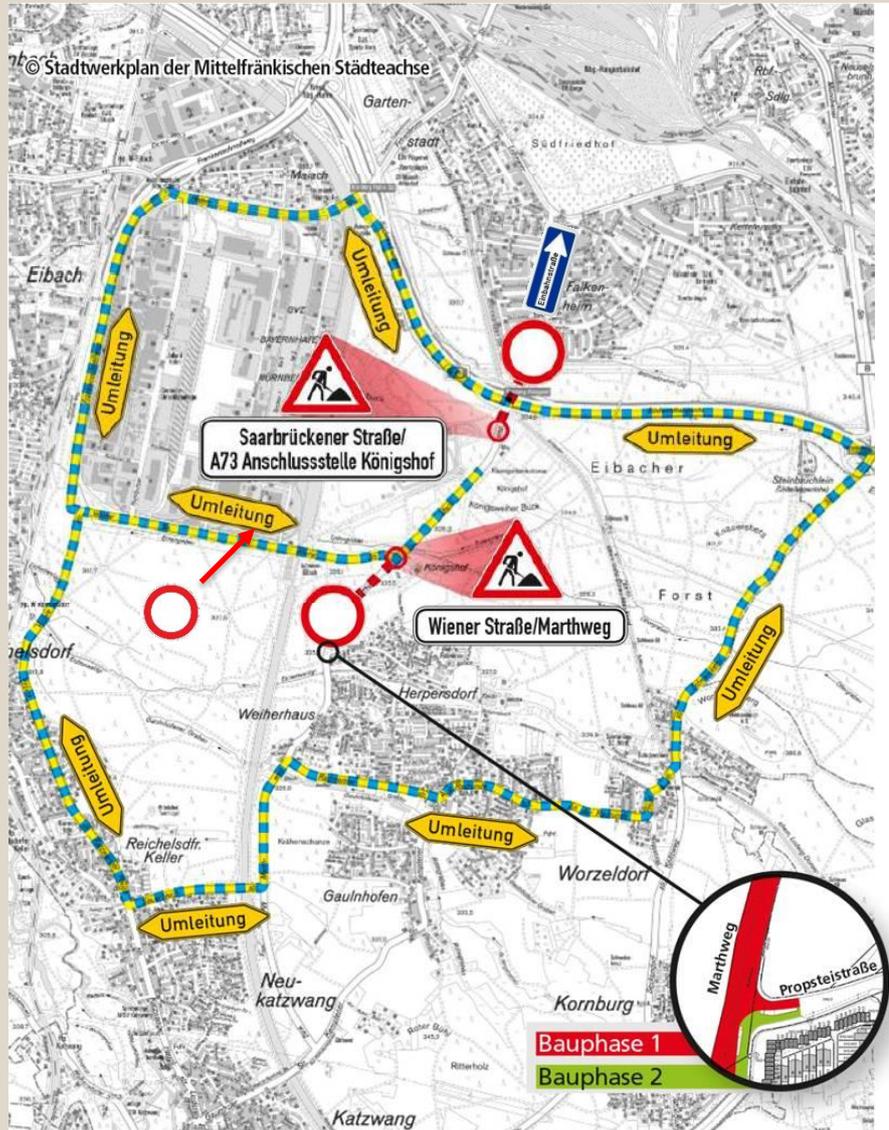

Sperrung 1
Saarbrückener Str. Bereich
A 73 AS Königshof


Sperrung 2
Südl. Marthweg zwischen
Wiener Str. – Propsteistr.

Sperrung 3
Linzer Straße

Einbahnregelung in der
Saarbrückener Straße
(nur 26.3.-7.4.18)

Umleitung Schwertransporte 26.03-30.04.2018 (Fz > 44 to)

Umleitung

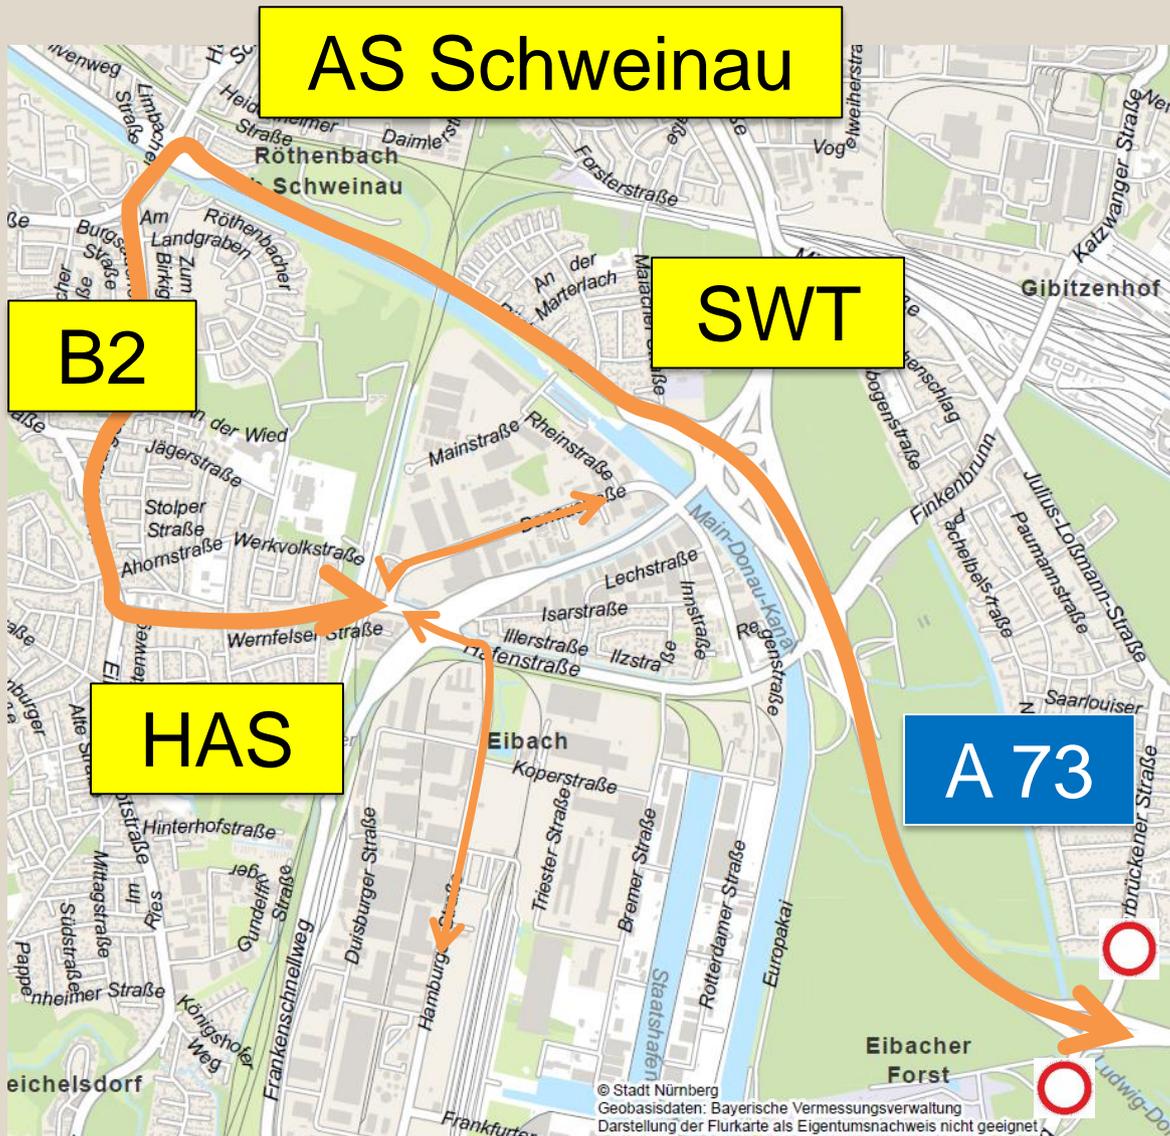


- Autobahn A 73
- Südwesttangente (SWT)
- AS Schweinau
- B14 Schweinauer Hauptstr.
- B2 Weißenburger Str.
- B2 Eibacher Hauptstr.
- Hafenstraße (HAS)
- Donaustr. od. Hamburger Str.



AS Königshof

Buslinien – VAG während Sperrung

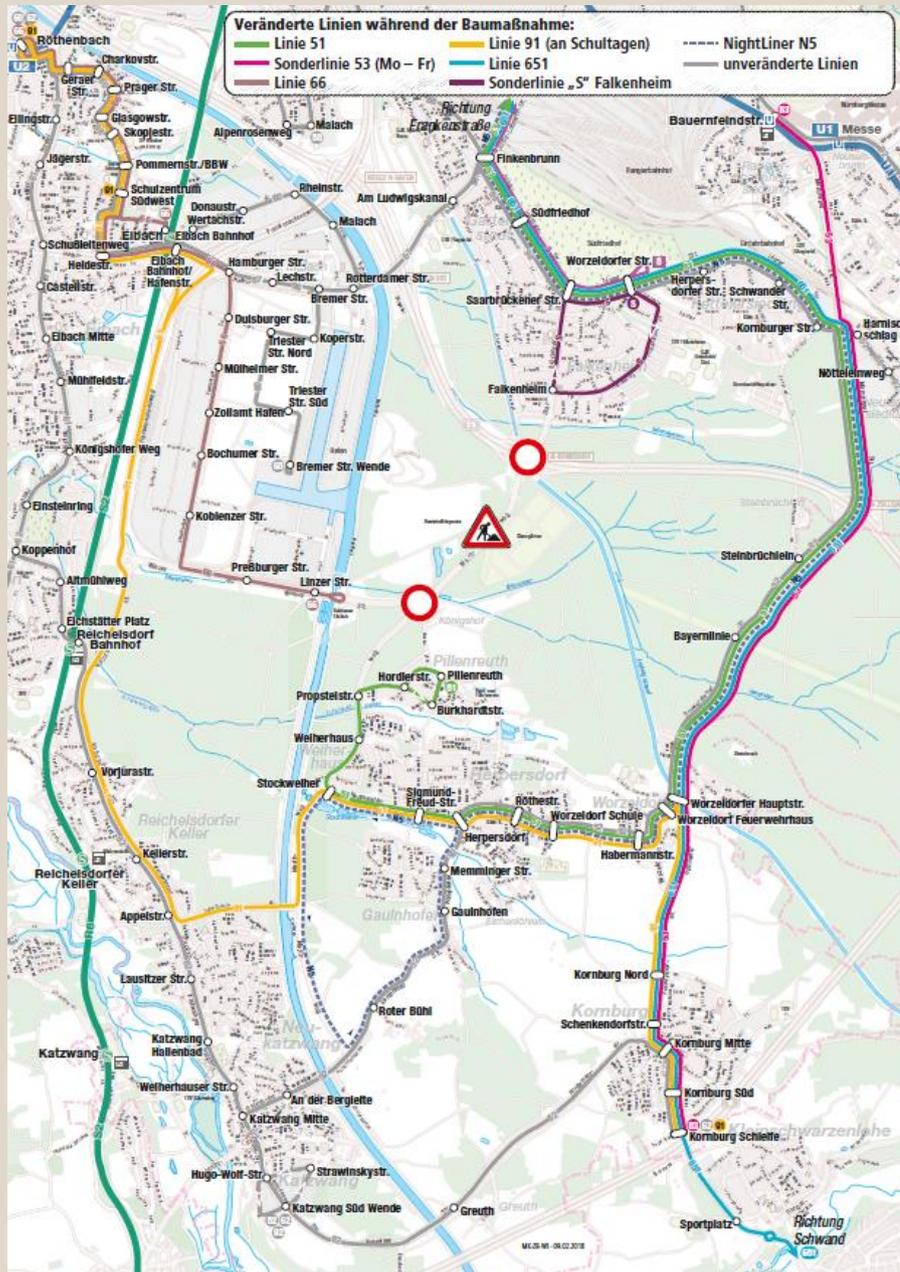

Geändert verkehren:

- Linien 51, 651 und N5
- Sonderlinie S
- Linie 66
- Schulbuslinie 91

Ohne Änderung verkehren:

- Linien 52, 62 und 92

Sonderlinie (Mo – Fr)

- Linie 53


Themen

1. Grundsätzliches zum Projekt Erneuerung der Hafibrücken
2. Bündelung von Maßnahmen im Bereich Saarbrückener Straße, Marthweg, Wiener Straße, Linzer Straße
3. Information zu den Provisorien zum Ersatzneubau der Hafibrücken

Beschlussvariante

Phase 1 – Bau Behelfsbrücken

Variante IV-A: Phase 1
 Dauer: 8 Monate
 Ziel: Bau Behelfsbrücke Hafens-
 straße und FSW, Rückbau
 Rampe Süd

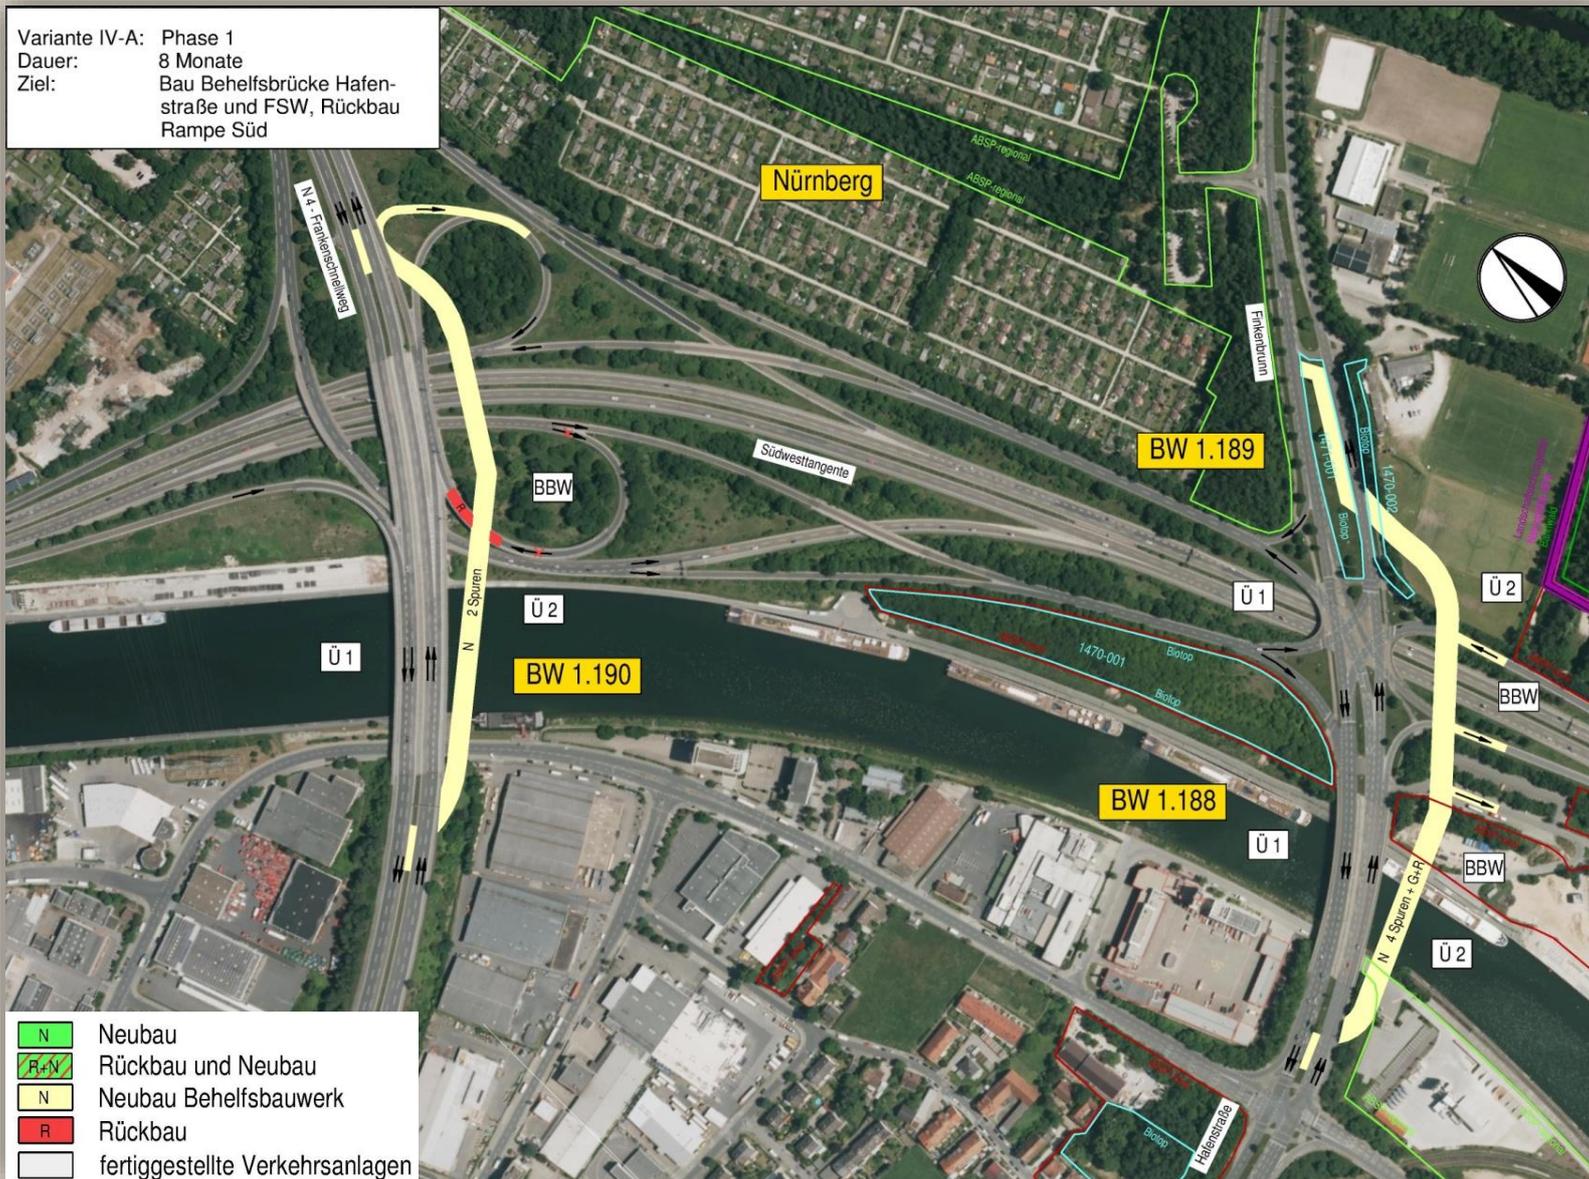


Quelle Kartengrundlage: Geobasisdaten
 © Bayerische Vermessungsverwaltung

Beschlussvariante

Phase 2 – Rückbau und Neubau

Variante IV-A: Phase 2
 Dauer: 24 Monate
 Ziel: Behelfsbrücken nutzbar,
 Rück- und Neubau Brücke
 FSW und Hafenstraße

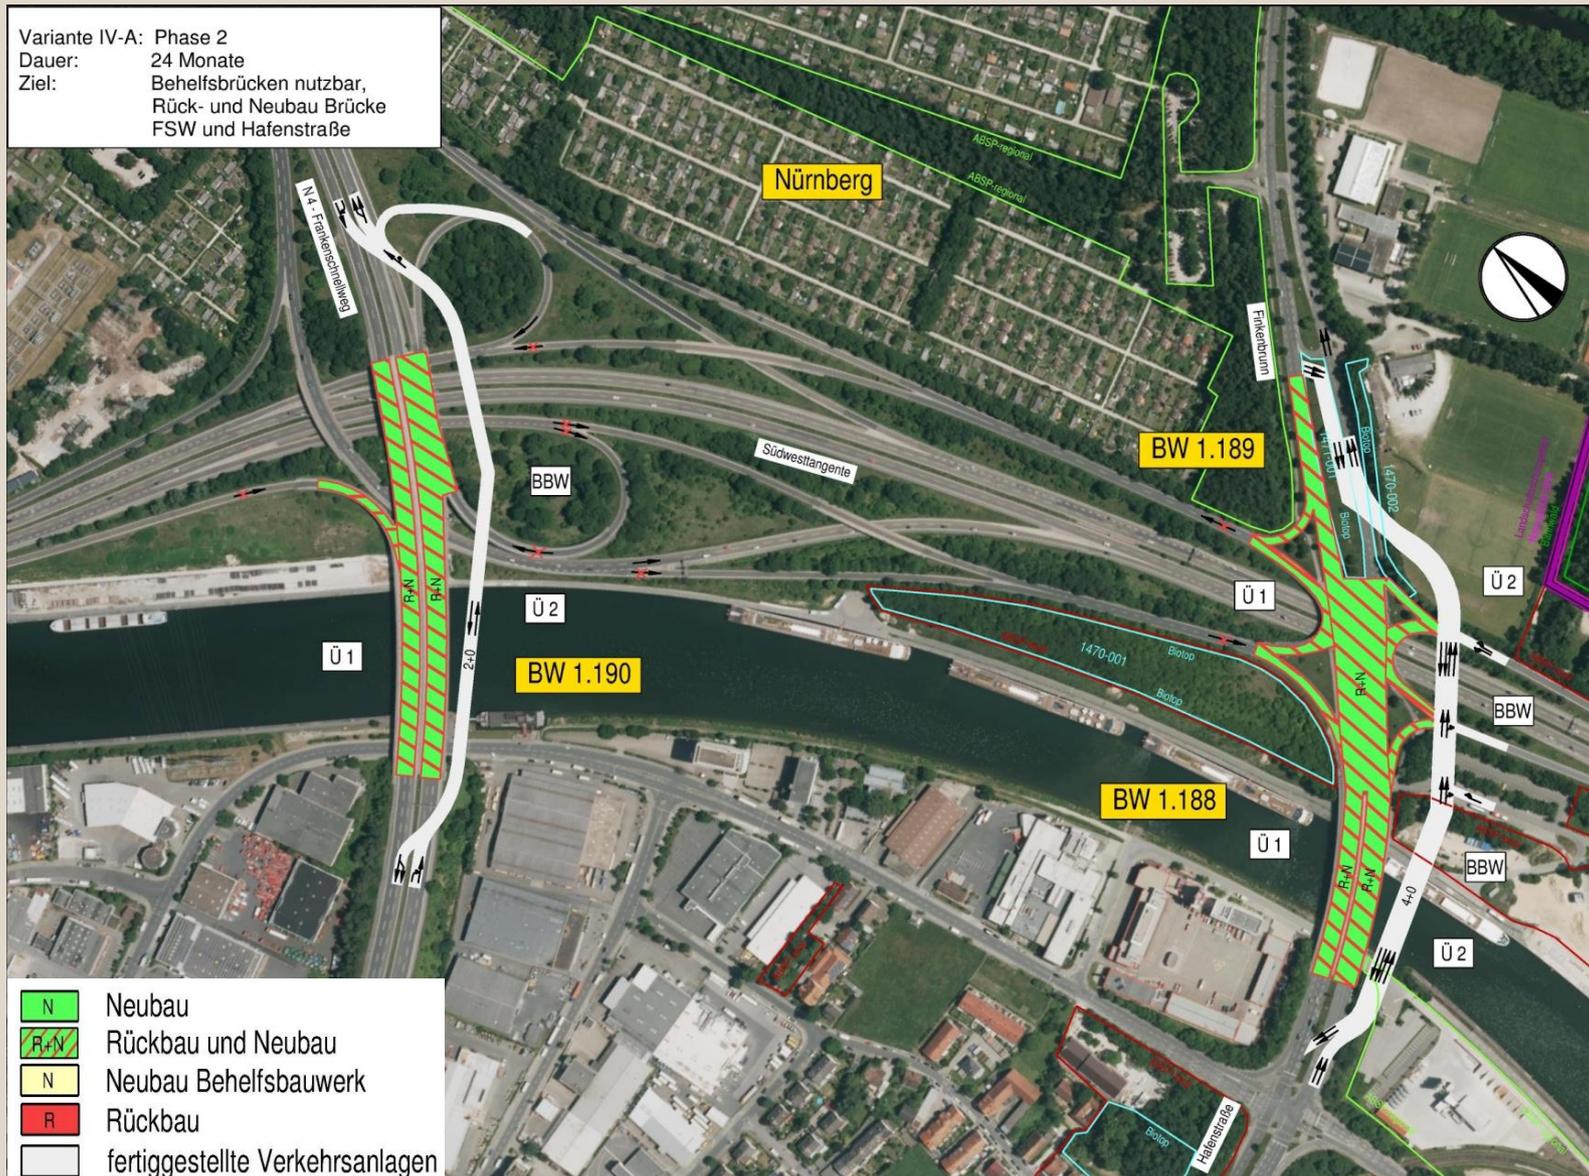


Quelle Kartengrundlage: Geobasisdaten
 © Bayerische Vermessungsverwaltung

Beschlussvariante

Phase 3 – Neubau und Abbau Behelfsbrücke

Variante IV-A: Phase 3
 Dauer: 10 Monate
 Ziel: Brücke Hafensstraße fertig,
 Rückbau Behelfsbrücke,
 Neubau Brücke FSW

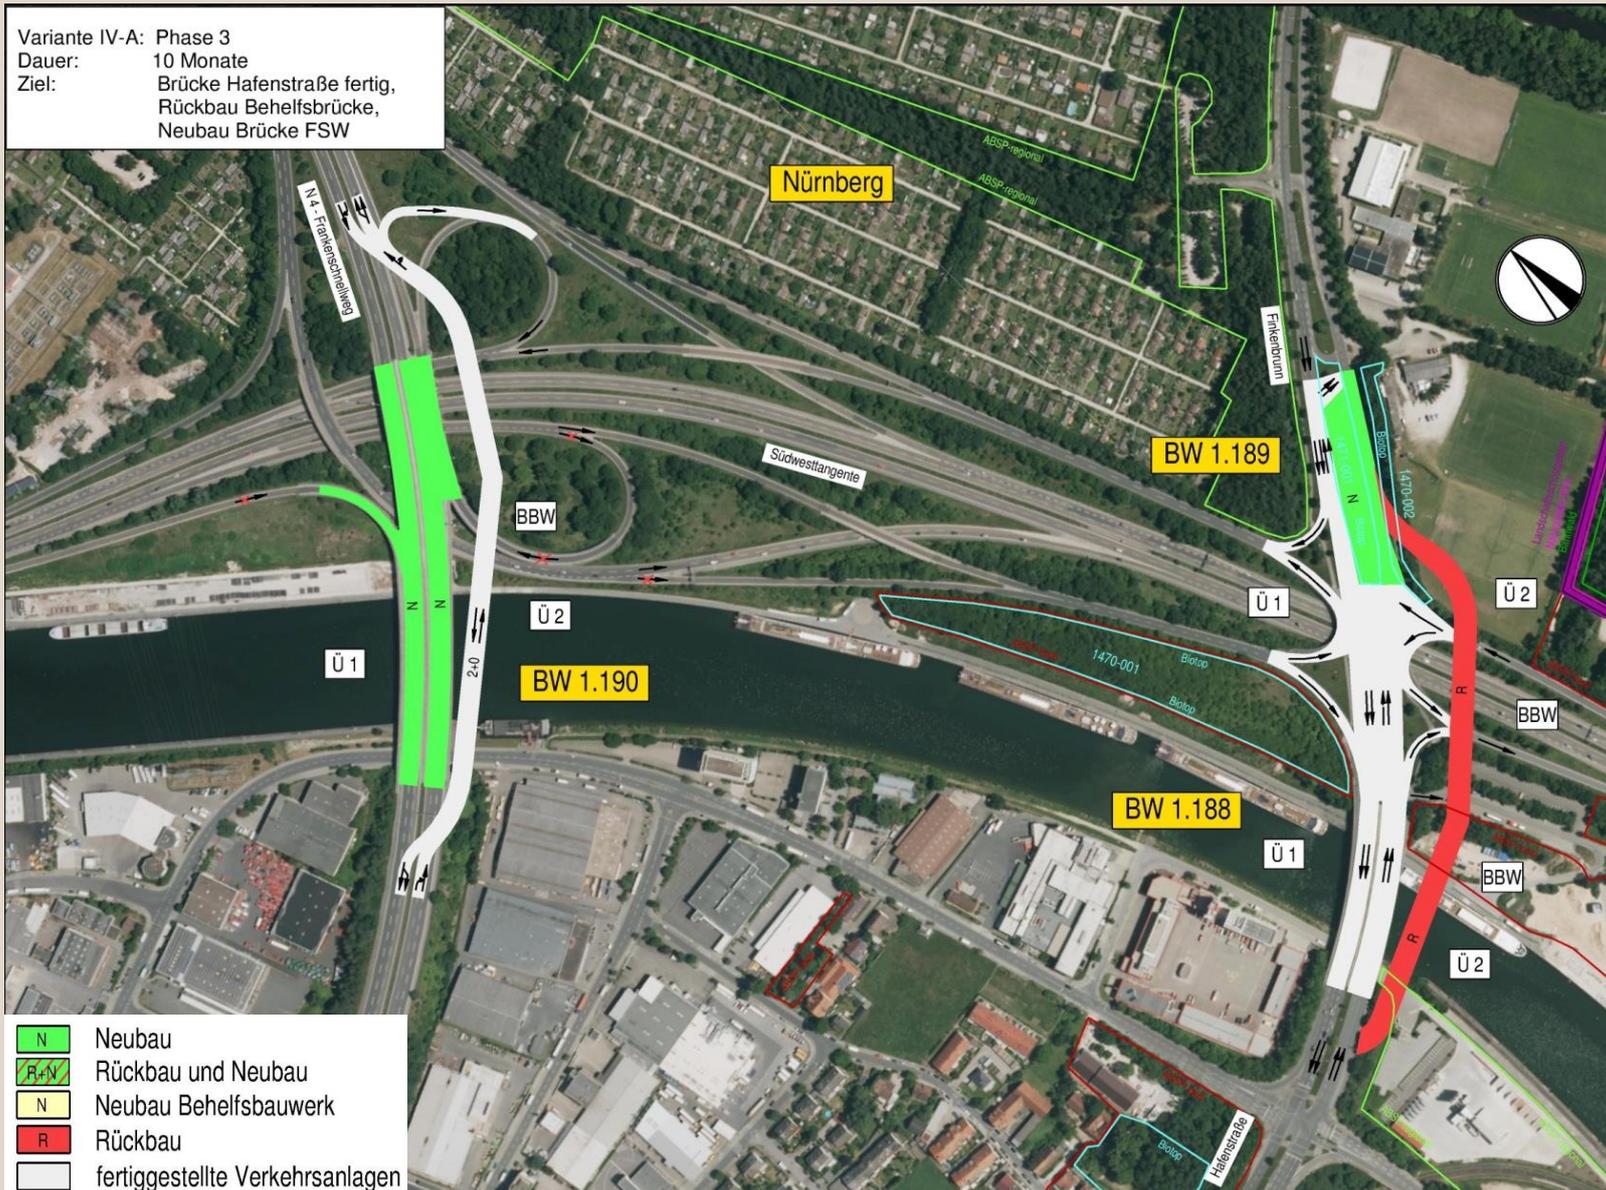


Quelle Kartengrundlage: Geobasisdaten
 © Bayerische Vermessungsverwaltung

Beschlussvariante

Phase 4 – Rückbau Behelfsbrücke FSW

Variante IV-A: Phase 4
 Dauer: 5 Monate
 Ziel: Brücke Hafenstr. und FSW Ü1 fertig, Neubau Ü2 und Rampe Süd, Rückbau Behelfsbr. FSW

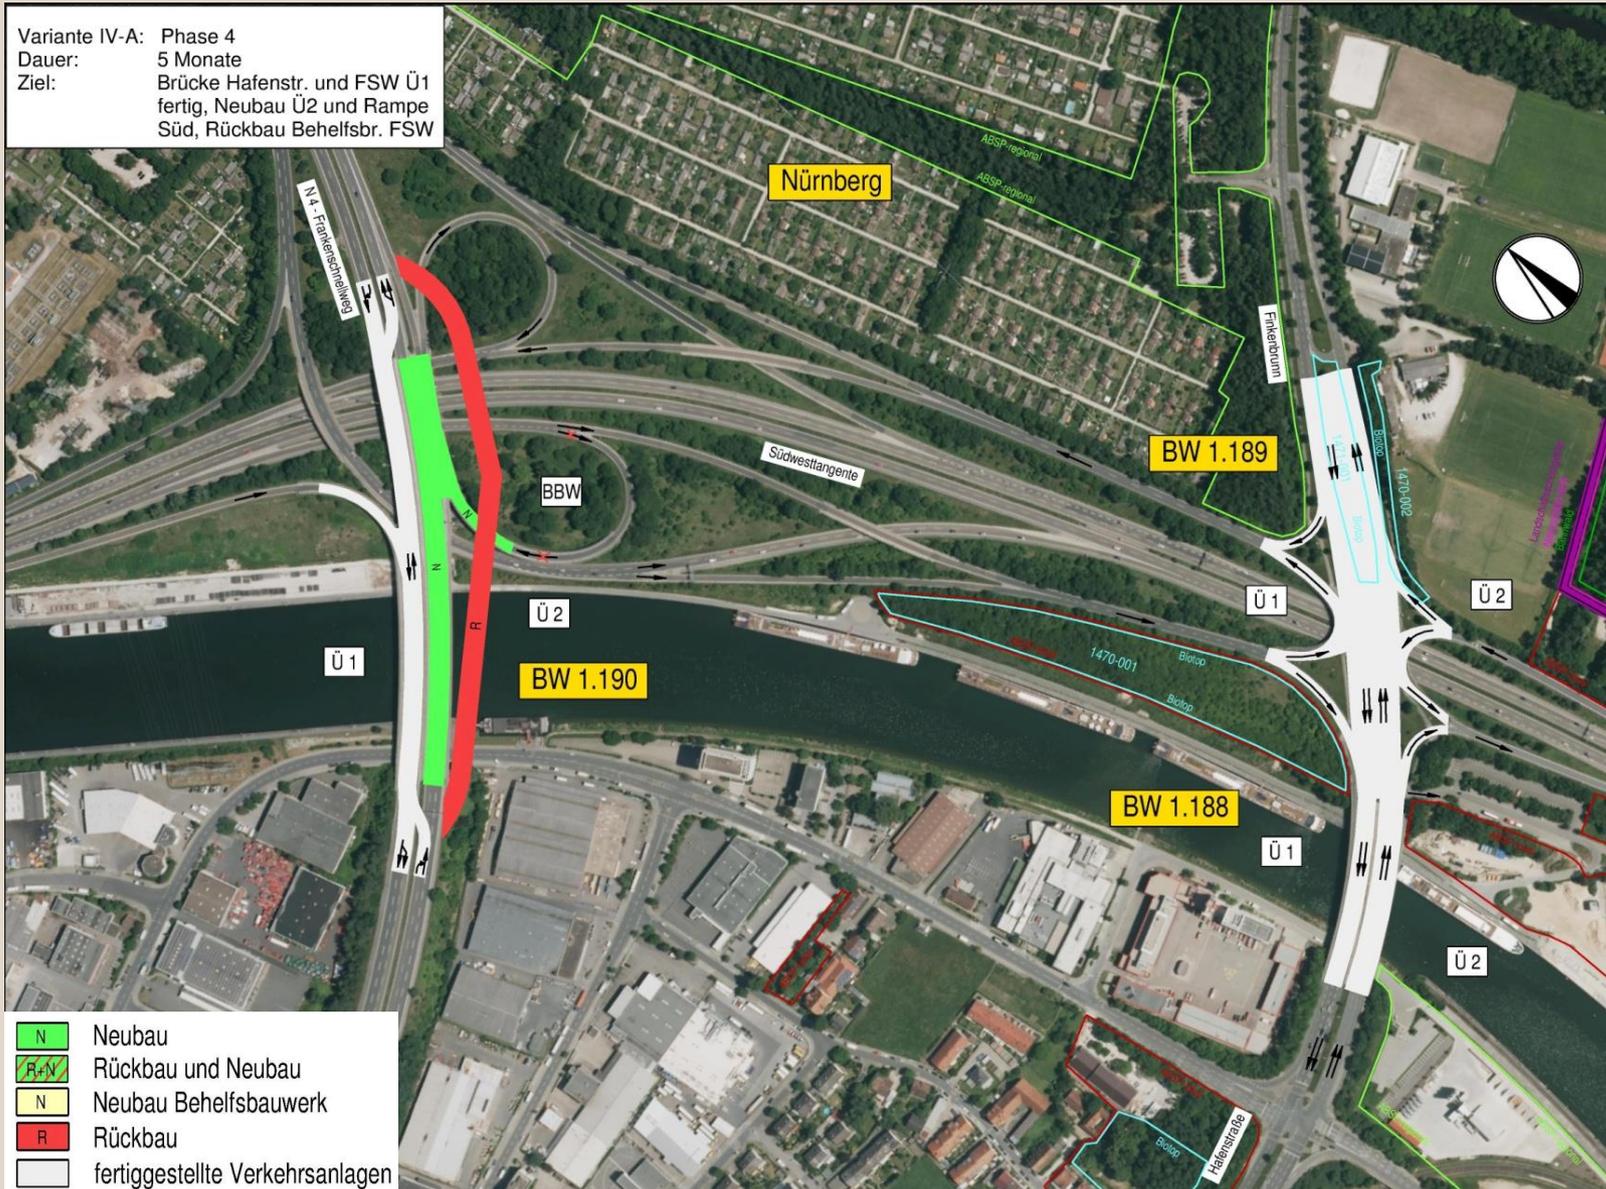

Quelle Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Nürnberg
Sulzbacher Straße 2-6
90489 Nürnberg

Servicetelefon SÖR
+49 (0)9 11 / 2 31-76 37

<http://www.nuernberg.de/internet/soer/>
